

BERICHT DER VERWALTUNG

Tourismusausschuss

25.05.2021


VANDALISMUSSCHÄDEN AM STANDBAD

- Ende März Graffitischäden am Gebäude im gesamten oberen Bereich
- Fensterscheibe strandseitig eingeworfen
- Verschmutzungen an den Wochenenden nehmen zu
- Sicherheitsdienst seit Anfang Mai an den Wochenenden wieder vor Ort
- Reparaturen/Malerarbeiten im April erfolgt



FESTPLATZVERTEILER MIT WANDLER FÜR SEEBRÜCKENVORPLATZ PELZERHAKEN

- Festplatzverteiler ist bestellt
- Einbau bis Mitte Juni erledigt
- Kosten ca. 9.000 € (eingeplant 5.000 €) da größer und zeitgemäßer dimensioniert
- Geld wird bei anderen Investitionen eingespart

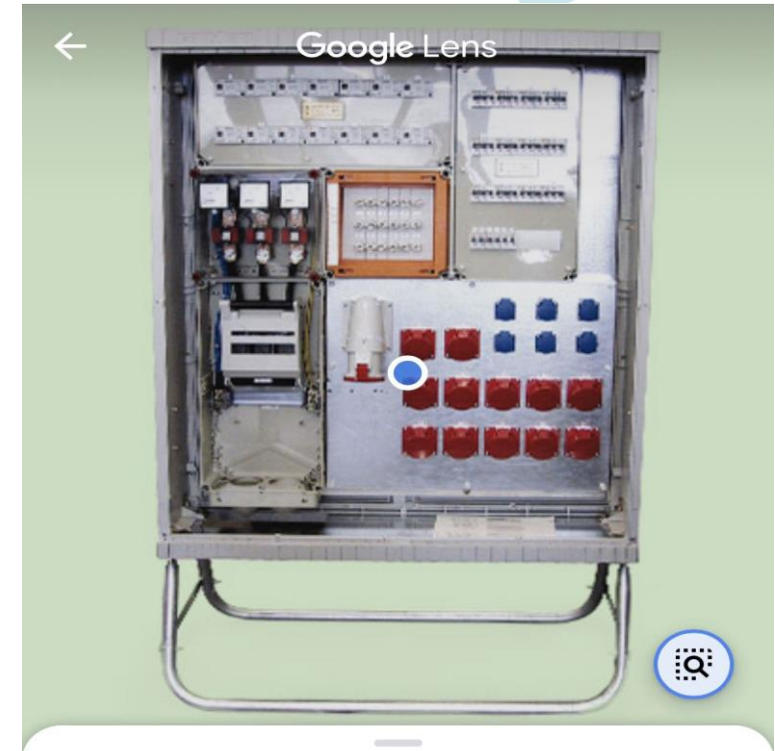

Ähnliche Bilder



ALLGEMEINES

- Alle Saisonvorbereitungen abgeschlossen (Bojen, Wege und Stege sowie Übergänge)
- Malerarbeiten DLRG-Stationen Pelzerhaken und Rettin werden in Auftrag gegeben
- 4 statt 3 Notrufsäulen, auch SurfCity hat eine Säule erhalten



OPTIMIERUNG BASKETBALLPLATZ RETTIN

- Pflaster für Erweiterung des Spielfeldes zur Zeit nicht lieferbar
- Sollte zu den Sommerferien aber erledigt werden

ERWEITERUNG BADEGEBIET PELZERHAKEN

- Eine Nachfrage beim Wasser- und Schifffahrtsamt Lübeck ergab, dass es keine Möglichkeit gibt, die Badezone in Richtung Eschenweg zu erweitern
- Ein privater Bootssteg zwischen jetziger Badezone und Eschenweg lässt keine Erweiterung zu
- Grund der Nachfrage waren seeseitige Lärmbelästigungen an schönen Sommertagen durch Eigner von Sportbooten in den letzten Jahren

PROJEKTE „DÜNENSTEG NEUSTADT“ „RUHEPLÄTZE AM STRANDE / UFERWEG“ SACHSTÄNDE

- Der Steg und die Ruheplätze sind Teile des geförderten Projektes „Neu- und Ausbau der Promenade „Jungfernstieg“ und „Am Strande“
- Lt. IB.SH läuft die Zweckbindung des Gesamtprojektes und somit auch der Teilprojekte am 30. Juni 2022 aus
- Nach Ablauf der Zweckbindung kann ein neuer Förderantrag zur Attraktivierung des Steges und u. U. auch zur Inwertsetzung der Ruheplätze gestellt werden
- In einem ersten Schritt wurde zur Vorabprüfung einer Förderfähigkeit eine Projektskizze mit beiden Bauvorhaben an die IB.SH gesandt
- Mit einer Antwort wird im Mai gerechnet

PROJEKT „UMGESTALTUNG HAUS DER GASTES“ SACHSTAND

- Baubeginn mit 1. Baubesprechung am 22. Februar 2021
- Aktueller Bauzeitenplan sieht Bauende für Anfang September 2021 vor
- 10. Baubesprechung am 10. Mai
- Zuschlag für Landschaftsbauarbeiten wurde erteilt
- Bis auf die Möbelbeschaffung sind alle Gewerke vergeben
- Trockenbauer startet in der 19. KW



PROJEKT „UMGESTALTUNG HAUS DER GASTES“ SACHSTAND

- Die Projektkosten liegen weiterhin im geplanten Kostenbereich (Stand 14. Mai 2021)
- Die 1. Überprüfung der Bauausführung durch die GMSH wurde in der 17. KW durchgeführt. Es gab keine Beanstandungen
- Der 1. Erstattungsantrag an die IB.SH wurde in der 18. KW gestellt und wird dort z. Zt. geprüft



**VIELEN DANK FÜR IHRE
AUFMERKSAMKEIT!**
